

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Agosto 2025


Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario a Agosto 2025

Componente	Programado Enero a Agosto (PAI 2025)	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Devengado	Anticipos	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado+Anticipos vs. Programado PAI 2025
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	812.073,70	2.385.961,19	235.200,34	2.127.164,16	348.062,50	0,00	348.062,50	23.596,69	42,86%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	214.779,50	235.777,82	1.996,09	227.734,12	186.261,42	10.109,39	60.694,60	6.047,61	91,43%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	9.442,00	19.442,00	192,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL PROFIP	1.036.295,20	2.641.181,01	237.388,43	2.364.148,28	534.323,92	10.109,39	408.757,10	39.644,30	52,54%

% Avance Presupuestario

Codificado: USD 2.641.181,01
Devengado: USD 534.323,92

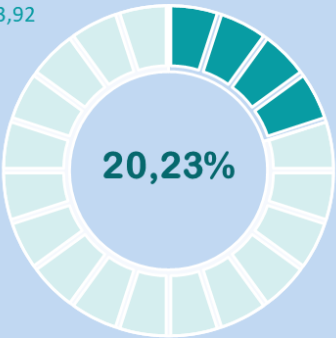

Fortalecimiento Institucional de la PGE

Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
- El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologaron los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se validó por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto total de USD 5.174.795,49.
- Con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0268-O del 02 de agosto de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el dictamen de actualización de prioridad del proyecto para el período 2019 – 2025, por el monto total de USD 5.174.795,49, posterior a ello la PGE gestionó la reprogramación del cronograma valorado obteniendo el criterio favorable con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0466-O del 22 de noviembre del 2024.
- En 2025, el MEF asignó un techo presupuestario para el proyecto de USD 2.473.471,45, dicho rubro fue distribuido en las diferentes actividades programadas para 2025, considerando que corresponde al último período fiscal de vigencia del proyecto, se dio prioridad a los procesos que cuentan con certificación presupuestaria plurianual, obligaciones contraídas y actividades más próximas a ejecutarse.
- Al cierre de agosto 2025 se registran montos devengados equivalentes al 20,23% del total codificado en Esigef que corresponde al valor devengado de USD 534.323,92, de la misma manera respecto al monto programado a devengar en el período enero - agosto, se alcanzó el 52,54%, en esta proporción se consideran también los anticipos entregados en los contratos de readecuación del Centro de Mediación en Cuenca y Riobamba, que aún no han sido amortizados.

Proyecto PROFIP

Estado de los procesos contractuales a agosto 2025:

Componente 1:

1. **“Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”**, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. A septiembre de 2023 se recibió el Producto 0, se pagó por MEF en diciembre 2023. El Producto 1 se recibió en mayo de 2024, se pagó en junio de 2024. A septiembre de 2024 se recibió el Producto 2, se pagó en noviembre de 2024. En diciembre se emitió la Enmienda No. 03, que modifica las fechas de entrega de los productos 3 al 11, hasta noviembre de 2025. A abril de 2025 se recibió los Productos 3 y 4, que se pagaron por MEF, con fecha 3 de junio de 2025 se recibió el producto 7, el mismo a la fecha se encuentra en revisión previa aprobación. Con fecha 28 de agosto se llevó a cabo reunión de conciliación de las partes con mediación del financista BID, para alcanzar acuerdos que permitan el avance del contrato/ **EN EJECUCIÓN.**
2. **“Capacitación en innovación y gestión del cambio en el sector público dirigido a los directivos y funcionarios del grupo anfitrión de la PGE”**, proceso terminado, se ejecutaron todos los pagos. / **FINALIZADO.**
3. **“Renovación parcial de equipos informáticos de usuario final a nivel nacional para fortalecer el hardware de la Procuraduría General del Estado”**, Proceso suspendido, en espera de lineamientos internos.
4. **“Especialista de Monitoreo y Seguimiento del EDG-PGE PROFIP”**, Contrato No. 005-PGE-PROFIP-2024, en diciembre 27 de 2024, cancelado los productos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. / **EN EJECUCIÓN.**
5. **“Especialista de Adquisiciones del EDG-PGE-PROFIP”**, Contrato No. 006-PGE-PROFIP-2024, en diciembre 27 de 2024, se han cancelado los productos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. / **EN EJECUCIÓN.**
6. **“Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del EDG-PGE PROFIP”**, en abril se firmó Contrato No. 002-PGE-PROFIP-2025, se ha pagado producto 1, 2, 3 y 4 / **EN EJECUCIÓN.**
7. **“Especialista Financiero del EDG-PGE PROFIP”**, en abril se firmó Contrato No. 003-PGE-PROFIP-2025, se ha pagado el producto 1, 2, 3 y 4 / **EN EJECUCIÓN.**
8. **“Especialista de Capacitación”**, Contrato No. 004-PGE-PROFIP-2025. / **EN EJECUCIÓN.**
9. **“Especialistas en Arquitectura (1)”**, Se firmó contrato No. 010-PGE-PROFIP-2025, en julio de 2025, se ha pagado producto 1. / **EN EJECUCIÓN.**
10. **“Especialistas en desarrollo de software (1)”**, Se firmó contrato No. 011-PGE-PROFIP-2025, en julio de 2025, se ha pagado producto 1. / **EN EJECUCIÓN.**
11. **“Especialistas para depuración de base de causas (3)”**, suspendido es espera de lineamientos internos.

Componente 2 y Componente 3:

Estos componentes a la fecha han concluido su gestión con 100% de ejecución.

Componente 4:

1. **“Readecuación del Centro de Mediación de Guayaquil”**, se recibió la No Objeción por parte de BID para iniciar un primer proceso. / **DECLARADO DESIERTO.**

Se realizó un segundo proceso, con fecha 24 de septiembre se firmó el Contrato No.004-PGE-PROFIP-2024, a la fecha se ha culminado la readecuación; por el cierre temprano de la herramienta E-sigef para 2024 no se pudo culminar con el pago del contrato. El pago fue realizado en marzo de 2025. / **FINALIZADO**
2. **“Readecuación del Centro de Mediación de Quito”**, Se firmó contrato No.005-PGE-PROFIP-2025 en proceso de pago en MEF. / **FINALIZADO.**
3. **“Readecuación del Centro de Mediación de Portoviejo”**, Se firmó contratos No. 006-PGE-PROFIP-2025, obra entregada a satisfacción. / **FINALIZADO**
4. **“Readecuación del Centro de Mediación de Riobamba”** Se firmó contratos No. 008-PGE-PROFIP-2025, en proceso de pago. / **FINALIZADO**
5. **“Readecuación de los Centros de Cuenca”** Se firmó contratos No. 009-PGE-PROFIP-2025, en proceso de pago. / **FINALIZADO**

Componente 5:

1. **“Capacitación en herramientas de comunicación”**, Se firmó contrato No. 007-PGE-PROFIP-2025, servicio recibido, en proceso de pago. / **FINALIZADO**
2. **“Encuesta de evaluación de percepción de la PGE”** Proceso suspendido en espera de lineamientos internos./ **EN ETAPA PREVIA.**
